

เรื่อง : โครงการสะพานทางเดินข้ามสนามหญ้าแข่งม้า Pavilion Walkway

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 1 เมษายน 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. งานสะพานทางเดินข้ามสนามหญ้าแข่งม้า Pavilion Walkway

ปัจจุบันทางเดินข้ามสนามหญ้าแข่งม้าไปอาคารสปอร์ตพาวิลเลียนเป็นโครงเหล็กตาข่ายปูด้วยแผ่นสแตนเลสต่อขึ้น ประกอบต่อกันเป็นทางเดิน และต้องยกเคลื่อนย้ายสลับตำแหน่งทุก 3 วันเพื่อไม่ให้หญ้าเหียง อีกทั้งโครงเหล็กทางเดินมีน้ำหนักมาก บางชิ้นมีการชำรุด ผุพัง แผ่นสแตนเลสขาด มีความเสี่ยงต่อสมาชิกผู้ใช้งาน จึงต้องดำเนินการออกแบบก่อสร้างสะพานทางเดินข้ามใหม่ เพื่อให้สมาชิกใช้งานสะดวกและปลอดภัย

2. วัตถุประสงค์ในการจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อออกแบบและก่อสร้างสะพานทางเดินข้ามสนามหญ้าแข่งม้า ให้เลื่อนเปลี่ยนตำแหน่งและเคลื่อนย้ายลากออกจากพื้นที่พร้อมนำกลับมาประกอบติดตั้งได้อย่างสะดวกและปลอดภัย พร้อมออกแบบก่อสร้างหลังคาและทางเดินเพื่อรับรองสมาชิกเดินเข้าอาคารสปอร์ตพาวิลเลียน

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 3.1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี และมีเงินทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยต้องยื่นสำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท แบบมาในซองเทคนิค
- 3.2. ผู้เสนอราคาต้องดำเนินธุรกิจงานก่อสร้างหรือผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างในครั้งนี้อยู่โดยมีผลงาน ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาเอกสารสัญญาหรือคำสั่งซื้อหรือหนังสือรับรองผลงานแบบมาในซองเทคนิค

4. ขอบเขตงาน

4.1 งานออกแบบและคำนวณแบบสะพานโครงข้อหมุนหรือโครงถัก Truss Bridge ข้ามทางหญ้า

- 4.1.1 ระยะความยาวของสะพาน Span 17.5 เมตร
- 4.1.2 ความกว้างทางเดินของสะพาน 2.4 เมตร
- 4.1.3 ราวกะทางเดินกันตกสูง 0.9 เมตร
- 4.1.4 น้ำหนักบรรทุกปลอดภัย Live Load 2,000 กิโลกรัม
- 4.1.5 โครงสร้างสะพานพาดระหว่างจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง โดยไม่สัมผัสสนามหญ้าแข่งม้า

เรื่อง : โครงการสะพานทางเดินข้ามสนามหญ้าแข่งม้า Pavilion Walkway

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 1 เมษายน 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

งานระบบฐานราก และงานออกแบบสะพานโครงข้อหมุนหรือโครงถัก ต้องมีการคำนวณออกแบบ และรับรองแบบโดยวิศวกรโยธา

4.1.6 สะพานสามารถเลื่อนเปลี่ยนตำแหน่งซ้าย-ขวา ระยะ 12 เมตร ใช้งานได้ตามจุดที่กำหนด (เพื่อให้หญ้าได้รับแสงแดดไม่เหลือง) โดยใช้ระบบมอเตอร์หมุนเลื่อน

4.1.7 วัสดุที่จะนำมาใช้จึงต้องสามารถรับทั้งแรงอัด แรงดึงได้ดี และมีน้ำหนักเบา เช่น อลูมิเนียม หรือ ดีกว่า

4.1.8 แผ่นพื้นทางเดินต้องเรียบ และมีส่วนที่เป็นพื้นทางเดินวัสดุพื้นกันลื่นหรือยางตลอดแนว หรือ ดีกว่า

4.1.9 สะพานที่ออกแบบต้องสามารถยกเคลื่อนย้ายโดยวิธีลากจูงออกจากพื้นที่ได้ โดยให้ใช้รถแทรกเตอร์ในการลากจูงในสัปดาห์ที่มีการแข่งม้า และหลังการแข่งขันแล้วเสร็จผู้ใช้งานก็ต้องลากสะพานกลับมาติดตั้งในตำแหน่งทางเดินอย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ซึ่งวิธีการ/ขั้นตอน/การถอด/การยกลากเคลื่อนที่/การประกอบติดตั้ง ให้รวมอยู่ในการออกแบบหรือแนวคิดวิธีการที่ดีกว่า ซึ่งต้องสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

4.1.10 งานปรับระดับโครงสร้างฐานรากฝั่งทางเดินถูกอล์ฟ 12 ตารางเมตร พื้นสโลปให้รับกับระดับโครงสร้างสะพานโครงข้อหมุนหรือโครงถัก Truss Bridge

4.1.11 ออกแบบติดตั้งระบบไฟส่องสว่างทางเดินสะพาน โดยเลือกใช้ LED Neon Flexible Light ,LED Strip Light พร้อมออกแบบสัญลักษณ์/ตราสมาคมฯ บริเวณราวสะพานทั้งสองด้านให้เหมาะสมเป็นจุดแลนด์มาร์คของสมาคมฯ โดยจุดเชื่อมต่อต้องเป็นพาวเวอร์ปลั๊กและติดตั้งเบรกเกอร์กันดูด RCBO ทั้งชุดเชื่อมต่อที่สะพานข้ามและปลายสายที่เชื่อมต่อกับตู้โหลด

4.1.12 สายไฟฟ้าใช้เป็นชนิด VCT-G 60227 IEC 450/750V หรือดีกว่า

4.1.13 เปิด-ปิดความแสงสว่างด้วย Motion Sensor หรือดีกว่า

4.2 งานออกแบบสะพานทางเดิน ข้ามทางทราย

4.2.1 ระยะความยาวของสะพาน Span 7 เมตร

4.2.2 ความกว้างทางเดินของสะพาน 2.4 เมตร

4.2.3 ออกแบบโครงสร้างสะพานทางเดินปรับระดับรับกับทางเดินสะพาน Truss Bridge สามารถวางราบกับทางทรายได้ และสามารถปรับระดับให้รับกับระดับทางเดินเข้าอาคารสปอร์ตพาวิลเลียนได้

เรื่อง : โครงการสะพานทางเดินข้ามสนามหญ้าแข่งม้า Pavilion Walkway

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 1 เมษายน 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

- 4.2.4 สะพานสามารถยกเปลี่ยนตำแหน่งซ้าย-ขวา ใช้งานได้ตามจุดที่กำหนด
- 4.2.5 วัสดุที่จะนำมาใช้จึงต้องสามารถรับทั้งแรงอัด แรงดึงได้ดี และมีน้ำหนักเบา เช่น อลูมิเนียม หรือ ดีกว่า
- 4.2.6 แผ่นพื้นทางเดินต้องเรียบ และมีส่วนที่เป็นพื้นทางเดินวัสดุพื้นกันลื่นหรือยางหรือดีกว่า
- 4.2.7 สะพานทางเดินที่ออกแบบต้องสามารถเคลื่อนย้ายโดยวิธียกในสัปดาห์ที่มีการแข่งม้า และหลังการแข่งขันแล้วเสร็จสะพานทางเดินก็ต้องกลับมาติดตั้งในตำแหน่งทางเดินอย่างสะดวกและปลอดภัย ซึ่งวิธีการ/ขั้นตอน/การถอด/การยก/การเคลื่อนที่/การประกอบติดตั้ง ให้รวมอยู่ในการออกแบบหรือแนวคิดวิธีการที่ดีกว่า ซึ่งต้องสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

4.3 งานออกแบบหลังคาและทางเดินฝั่งอาคารสปอร์ตพาวิลเลียน

- 4.3.1 ดัดช่องผนังกำแพง โลโก้ทางเข้า RBSC SPORTS PAVILION ยาว 1.5 เมตร สูง 1.2 เมตร หนา 0.5 เมตร เพื่อเปิดช่องทางรับทางเดินเข้าอาคารสปอร์ตพาวิลเลียน
- 4.3.2 งานปรับโครงสร้างฐานรากพื้นที่ทางเดิน 12 ตารางเมตร ให้รับกับระดับโครงสร้างอาคารสปอร์ตพาวิลเลียนและระดับสะพานทางข้ามทราย
- 4.3.3 งานปูพื้นทางเดิน ยาว 8 เมตร กว้าง 1.5 เมตร (พื้นที่ 12 ตารางเมตร) อ้างอิงรูปแบบวัสดุปูพื้นทางเดินเข้าอาคารสปอร์ตพาวิลเลียน (กระเบื้องปูพื้น KENZA I หรือดีกว่า)
- 4.3.4 งานติดตั้งราวกันตก กระจกนิรภัย Laminated Double Glass กว้าง 1 เมตร ยาว 1.36 เมตร หนา รวม 12 มิลลิเมตร ความสูง 1.10 เมตร ตลอดแนวทางเดิน ความยาว 9.5 เมตร (รูปตัว L) อ้างอิงรูปแบบวัสดุราวกระจกกันตกโครงสร้างอาคารสปอร์ตพาวิลเลียน
- 4.3.5 ออกแบบงานหลังคาและรางระบายน้ำโดยใช้แนวอาคารสปอร์ตพาวิลเลียนความสูงไม่น้อยกว่า 3.2 เมตร พื้นที่ 35 ตารางเมตร อ้างอิงรูปแบบวัสดุโครงสร้างอาคารสปอร์ตพาวิลเลียน
- 4.3.6 งานระบบไฟส่องสว่างทางเดิน ต้องออกแบบเป็นไปตามมาตรฐานความเข้มแสงสว่าง ไม่น้อยกว่า 100 Lux
- 4.3.7 งานออกแบบและติดตั้งสัญลักษณ์/ตราสมาคมฯ บริเวณราวกระจกกันตกหรือตำแหน่งที่ดีกว่าให้เหมาะสมเป็นจุดแลนด์มาร์คของสมาคมฯ



หน้า 11

Wang

เรื่อง : โครงการสะพานทางเดินข้ามสนามหญ้าแข่งม้า Pavilion Walkway

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 1 เมษายน 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

4.4 งานติดตั้งอุโมงค์ผ้าใบ

4.4.1 สะพานที่ออกแบบต้องมีอุโมงค์ผ้าใบติดตั้งและถอดออกได้ และสามารถใช้งานเลื่อนคลุมทางเดินสะพานได้ตลอดแนว ความยาวรวม 25 เมตร (โดยประมาณ) วัสดุที่ใช้ต้องเป็นสแตนเลสหรือดีกว่า

4.5 งานตรวจสอบสาธารณูปโภคที่อยู่ในพื้นที่ กรณีพบเป็นอุปสรรคต่อการรื้อถอนก่อสร้างให้ดำเนินการย้ายตัดต่อระบบถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ดำเนินการ

4.6 งานรื้อย้ายสิ่งกีดขวาง อุปสรรคการก่อสร้าง ต้นไม้ รั้วไม้ แนวรางระบายน้ำ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ดำเนินการ และต้องตัดต่อให้ระบบกลับมาใช้งานได้หลังดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

4.7 งานติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมดต้องติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานงานติดตั้งระบบไฟฟ้า สมาคมวิศวกรรมสถาน(สวท.)อิงมาตรฐาน IEC,NEC

4.8 อุปกรณ์ไฟฟ้าที่นำติดตั้ง ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือ IEC,NEC

4.9 ก่อนดำเนินงานให้ผู้รับจ้าง ออกแบบคำนวณโครงสร้างสะพาน แบบฐานราก แบบหลังคา ระบบไฟฟ้าไฟส่องสว่าง แสดงรายละเอียดการติดตั้ง แบบทำงาน (SHOP DRAWING) พร้อมวิศวกรเซ็นต์แบบ เสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณารับทราบเห็นชอบก่อน และผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบแสดงการติดตั้งจริง (ASBUILT DRAWING) เสนอต่อผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย

5. เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

5.1 เวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 08.00 น. – 21.00 น. ยกเว้น วันก่อนวันแข่งขันม้าและวันแข่งขันม้า

สำหรับงานโครงสร้างฐานรากตัดต่อและเชื่อมต่องานระบบงานหลังคา (มีเสียงดัง) ตั้งแต่เวลา 21.00 – 04.00 น.

5.2 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและด้านความปลอดภัย ดังต่อไปนี้

5.2.1 ขั้นตอนการอบรมก่อนเริ่มงานตามกฎหมาย ผู้รับจ้างต้องผ่านการอบรมก่อนเข้าทำงานตามกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจากทางสมาคมฯ

5.2.2 ขั้นตอนเอกสารก่อนเข้าเริ่มงาน ผู้รับจ้างต้องจัดทำเอกสารงานด้านความปลอดภัยต่างๆส่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยก่อนเข้าทำงาน อาทิ

นางสาว

นางสาว

เรื่อง : โครงการสะพานทางเดินข้ามสนามหญ้าแข่งม้า Pavilion Walkway

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 1 เมษายน 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

5.2.2.1 แบบวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและมาตรการควบคุม JSA

5.2.2.2 แบบฟอร์มขอทำบัตรอนุญาตรายชื่อผู้เข้าปฏิบัติงาน

5.2.2.3 ใบขออนุญาตทำงานประเภทต่างๆ Work Permit

5.2.2.4 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้รับจ้าง PPE

5.2.2.5 รายการเครื่องมือ/เครื่องจักร ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง

5.2.2.6 รายชื่อผู้รับผิดชอบงาน เช่น วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
พร้อมแนบเอกสารใบประกอบวิชาชีพหรือใบรับรองตามที่กฎหมายกำหนด

5.2.3 ขั้นตอนปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามนี้

5.2.3.1 นำรายการและอุปกรณ์เครื่องมือ/เครื่องจักร รวมถึงอุปกรณ์ดับเพลิง พร้อมให้เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยของทางสมาคมฯ ตรวจสอบเช็คอยู่ในสภาพปลอดภัยพร้อมใช้งาน

5.2.3.2 ผู้รับจ้างต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ตามลักษณะของงาน
อย่างเคร่งครัด

5.2.3.3 กั้นขอบเขตพื้นที่การปฏิบัติงานพื้นที่เสี่ยงและติดตั้งป้ายเตือนอันตราย

5.2.3.4 ห้ามสูบบุหรี่ทุกพื้นที่ ยกเว้นพื้นที่สูบบุหรี่ที่จัดไว้ให้เท่านั้น

5.2.3.5 ห้ามถ่ายภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต

5.2.3.6 รับประทานอาหารและใช้ห้องน้ำในพื้นที่ที่จัดไว้ให้เท่านั้น

5.2.3.7 ห้ามเล่นการพนัน ห้ามทะเลาะวิวาท ห้ามพกพาสิ่งเสพติด อาวุธ ของมีคมหรือสิ่งผิด
กฎหมายเข้ามาในพื้นที่สมาคมฯ

5.3 ผู้รับจ้างต้องขนย้ายเศษวัสดุเดิมให้จัดเก็บภายในพื้นที่สมาคมฯ ตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนด

5.4 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุจากสะเก็ดไฟเชื่อมทุกพื้นที่การทำงาน

5.5 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือ นั่งร้าน บันได หรืออุปกรณ์อื่นๆ ให้พร้อมสำหรับการทำงาน
ไม่สามารถนำอุปกรณ์ของทางสมาคมฯ ไปใช้งานได้

5.6 กรณีผู้รับจ้างทำความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวอาคาร พื้น ผนัง หรืออื่นๆ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้แล้ว
เสร็จก่อนส่งมอบงาน

5.7 ผู้รับจ้างต้องดูแลเรื่องความสะอาดของสถานที่ รวมทั้งจัดเก็บและขนย้ายเศษวัสดุจากการทำงาน
นำออกไปทิ้งภายนอกสมาคมฯ ทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้งานของอาคาร
สถานที่ทุกวัน

น.น.น.

Wang

เรื่อง : โครงการสะพานทางเดินข้ามสนามหญ้าแข่งม้า Pavilion Walkway

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 1 เมษายน 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

- 5.8 ผู้รับจ้างต้องส่งแผนงานและรายงานประเมินความเสี่ยงในการทำงานให้กับผู้ควบคุมงาน ก่อนเข้าทำงานล่วงหน้า 14 วัน

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาในการดำเนินการภายใน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับจากแผนงานที่ได้รับการอนุมัติ

7. งานที่ต้องส่งมอบ

- 7.1 งานสะพานทางเดินข้ามสนามหญ้าแข่งม้า Pavilion Walkway จำนวน 1 งาน
- 7.2 รายการคำนวณโครงสร้าง ฐานราก หลังคา จำนวน 2 ชุด
- 7.3 เล่มรายงานภาพถ่ายการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานจนแล้วเสร็จ จำนวน 2 เล่ม
- 7.4 บัญชีรายชื่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ Equipment and Machine List จำนวน 2 เล่ม
- 7.5 หนังสือรับประกันผลงาน จำนวน 2 ชุด
- 7.6 หนังสือส่งมอบ จำนวน 2 ชุด
- 7.7 แบบ As-Built Drawing พร้อมรายการคำนวณโครงสร้าง จำนวน 2 ชุด
- 7.8 ไฟล์เอกสารส่งมอบงานทั้งหมดบนที่ลงแฟลชไดรฟ์ จำนวน 1 ชุด

8. การยื่นข้อเสนอ

ผู้เสนอราคาต้องยื่นซองข้อเสนอโครงการที่ปิดผนึกเรียบร้อย โดยยื่นแยกเป็น 2 ซอง ได้แก่

8.1.ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

- 8.1.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 8.1.2 สำเนา ภพ. 20 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 8.1.3 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
- 8.1.4 หนังสือยอมรับเงื่อนไขและคุณสมบัติที่ทางสมาคมฯ กำหนด
- 8.1.5 แผนการทำงานไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับจากแผนงานที่ได้รับการอนุมัติ
- 8.1.6 แนวคิดไอเดียในการออกแบบ Concept Design
- 8.1.7 แบบภาพสะพานทางเดินข้ามสนามหญ้าแข่งม้า Pavilion Walkway (3D Perspective) ทั้งระบบ
- 8.1.8 เอกสารอ้างอิงผลงาน เช่น เอกสารสัญญา หรือ ใบสั่งซื้อ หรือ หนังสือรับรองงานก่อสร้างหรือผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างในครั้งนี้ โดยมีผลงาน ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา

เรื่อง : โครงการสะพานทางเดินข้ามสนามหญ้าแข่งม้า Pavilion Walkway

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 1 เมษายน 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

8.2.ของข้อเสนอทางด้านราคา จำนวน 1 ชุดประกอบด้วย

เอกสารเสนอราคากระบวนเป็นปริมาณงานต่อหน่วย โดยต้องยื่นราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ส่งใบเสนอราคา ตามรายละเอียดขอบเขตงานข้อ 4. พร้อมระบุรายละเอียดวงงานและเงื่อนไขการชำระเงิน

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องระบุที่หน้าซองด้วยว่าเป็น “ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค” หรือ “ซองข้อเสนอทางด้านราคา” ปิดผนึกซองให้เรียบร้อย และยื่นต่อแผนกจัดซื้อ สมาคมราชกรีฑาสโมสร 02-028-7272 ต่อ 1292

9. หลักประกัน

9.1 ผู้เสนอราคา หากได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันสัญญา (Performance Bond) จำนวน 10% ของมูลค่างานตามสัญญา โดยเป็นหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

9.1.1 เงินสด

9.1.2 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ

9.1.3 แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายสมาคมฯ ระบุวันที่ชัดเจน

โดยทางสมาคมฯ จะถือไว้ใช้เป็นหลักประกันตลอดระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จ โดยหลักประกันนี้ จะคืนให้กับผู้รับจ้างเมื่อดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จโดยไม่มีดอเบี้ย

9.2 ผู้รับจ้างจะต้องทำประกันภัยบุคคลที่ 3 ขณะเข้าปฏิบัติงานในสมาคมฯ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยมีวงเงินคุ้มครองตามมูลค่าสัญญา และจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้กับสมาคมฯ ก่อนเริ่มดำเนินการ

9.3 ผู้รับจ้างจะต้องมีประกันอุบัติเหตุให้กับผู้ปฏิบัติงาน ครอบคลุมความปลอดภัยขณะเข้าปฏิบัติงานในสมาคมฯ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และจัดส่งกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุหรือสำเนากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ (กรณีที่ผู้รับจ้างได้ทำประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มสำหรับลูกจ้างไว้แล้ว) ให้กับสมาคมฯ ก่อนเริ่มดำเนินการ

10. การรับประกันสินค้า

10.1 ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องของงานเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยนับจากวันที่สมาคมฯ รับมอบงาน กรณีเกิดเหตุชำรุด บกพร่อง ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขการชำรุดภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดระยะเวลารับประกัน



นายก

Mangy

เรื่อง : โครงการสะพานทางเดินข้ามสนามหญ้าแข่งม้า Pavilion Walkway		
จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ	วันที่จัดทำ: 1 เมษายน 2568	(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

- 10.2 กรณีเกิดการชำรุดเสียหายของโครงสร้างและอุปกรณ์ที่ติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องทำการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติภายใน 7 วันนับจากที่ได้รับแจ้ง ตลอดระยะเวลาประกัน

11. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

สมาคมฯ จะจ่ายเงินครบทั้งจำนวนหรือตามงวดงานที่ได้ตกลงกัน ภายใน 30 วันหรือตามที่ได้ตกลงกัน นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับลงนามรับมอบงาน และผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามกระบวนการวางบิลของสมาคมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

12. กระบวนการพิจารณาข้อเสนอ

- 12.1 สมาคมฯ จะพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิคของผู้ยื่นซองทุกราย โดยข้อเสนอทางเทคนิคที่ผ่านการพิจารณาต้องสอดคล้องกับความต้องการของสมาคมฯ ที่ระบุในขอบเขตของงาน และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน
- 12.2 สมาคมฯ จะเปิดซองข้อเสนอด้านราคาของผู้ยื่นซองเฉพาะรายที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคที่สอดคล้องกับความต้องการของสมาคมฯ ที่ระบุในขอบเขตของงาน และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน
- 12.3 สมาคมฯ จะพิจารณาคูณสมบัติราคา และคุณภาพงาน และดำเนินการเจรจาต่อรองราคากับผู้ยื่นซองที่มีข้อเสนอทางด้านเทคนิค และข้อเสนอทางด้านราคาที่ดีที่สุด
- 12.4 หากการเจรจาไม่เป็นผล สมาคมฯ จะพิจารณายกเลิกการเจรจาต่อรองกับผู้ยื่นซองรายนั้น และจะพิจารณาผู้ยื่นซองที่มีข้อเสนอทางด้านเทคนิค และข้อเสนอทางด้านราคาที่ถูกลงมา และดำเนินการเช่นเดียวกับรายแรก จนกว่าจะได้ราคาที่เหมาะสม และอยู่ในงบประมาณ
- 12.5 ผู้ยื่นซองต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นซองรายอื่นที่เข้าเสนอราคาแก่สมาคมฯ ณ วันเสนอราคานี้ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม
- 12.6 สมาคมฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดได้ และอาจพิจารณาเลือกเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาเลยก็ได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของสมาคมฯ เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของสมาคมฯ เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นซองจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้



นงน

Mangy

เรื่อง : โครงการสะพานทางเดินข้ามสนามหญ้าแข่งม้า Pavilion Walkway

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 1 เมษายน 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :**13. ระยะเวลาการพิจารณาข้อเสนอ**

13.1 กำหนดประชุมชี้แจงรายละเอียดและดูสภาพหน้างานวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Stewards Box

13.2 กำหนดยื่นซองภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. ณ แผนกจัดซื้อสมาคมราชกรีฑาสโมสร ติดต่อคุณกุลวดี โทร. 02-028-7272 ต่อ 1292

14. ความรับผิดชอบต่อความเสียหาย**14.1 การบอกเลิกสัญญา**

14.1.1 สมาคมฯ มีสิทธิในการบอกเลิกสัญญาได้ในกรณีที่การเข้าดำเนินงานของผู้รับจ้างไม่ตรงกับที่กำหนดโดย สมาคมฯ จะแจ้งการบอกเลิกสัญญาล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

14.1.2 หากการดำเนินงานของผู้รับจ้างไม่มีความคืบหน้าภายในเวลาอันสมควร หรือมีแนวโน้มที่เชื่อว่า จะไม่ทำงานแล้ว หรือละทิ้งงาน สมาคมฯ สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาและว่าจ้างผู้รับจ้างรายอื่นที่ สมาคมฯ พิจารณาว่าสมควรมาดำเนินการส่วนที่เหลือ โดยสมาคมฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากผู้รับจ้าง

14.1.3 ผู้รับจ้างจะต้องรักษาความลับของสมาคมฯ และความลับในการให้คำปรึกษา หากมีการละเมิดทางสมาคมฯ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายและยกเลิกสัญญาการจัดจ้างได้ โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

15. การจ้างช่วง

ห้ามผู้รับจ้างนำงานทั้งหมดตามสัญญานี้ ไปจ้างเหมาช่วงอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุมัติจากสมาคมฯ เป็นลายลักษณ์อักษร หากผู้รับจ้างฝ่าฝืน สมาคมฯ จะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทันที

16. หน้าที่ทางภาษีของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าภาษี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และอากรแสตมป์ใดๆ ที่เกี่ยวกับการว่าจ้างของโครงการนี้



ท.ร.เจต



เรื่อง : โครงการสะพานทางเดินข้ามสนามหญ้าแข่งม้า Pavilion Walkway

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 1 เมษายน 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

17. บทปรับ

- 17.1 กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ สมาคมฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ หากผู้รับจ้างได้เริ่มงานใดๆ อันส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อทรัพย์สินของสมาคมฯ ก่อนการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อให้ทรัพย์สินของสมาคมฯ ดังกล่าวกลับสู่สภาพเดิม
- 17.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้ากว่าที่กำหนด สมาคมฯ จะดำเนินการคิดค่าปรับวันละ 0.1% ของมูลค่างานตามสัญญา
- 17.3 กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ โดยไม่ใช่กรณีที่ผู้รับจ้างจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและไม่ใช้กรณีทำผิดกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขต่างๆ ของสัญญานี้ได้ หรือเป็นเหตุอันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกตามระยะเวลาดังกล่าว

18. การป้องกันด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

- 18.1 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาแก่สมาคมฯ ณ วันเสนอราคานี้ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม
- 18.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับคณะกรรมการประเมินโครงการนี้

19. คำรับรองของผู้รับจ้าง

- 19.1 ผู้รับจ้างจะจัดจ้างบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะสอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย และได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 19.2 ผู้รับจ้างจะดำเนินการโดยเลือกใช้วัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีคุณภาพดีปลอดภัยต่อการใช้งาน และได้มาตรฐานสำหรับงานที่จ้างตามสัญญานี้
- 19.3 ผู้รับจ้างจะจัดการเปลี่ยนบุคลากรมาปฏิบัติงานทดแทนทันที ในกรณีบุคลากรของผู้รับจ้างมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือปฏิบัติงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ว่าจ้างโดยทันที
- 19.4 ผู้รับจ้างจะไม่โอนสิทธิหรือหน้าที่ใดๆ ตามสัญญาให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้าง
- 19.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างหรือบุคลากรของผู้รับจ้าง จะเข้ามาปฏิบัติงานตามสัญญานี้ภายในสถานที่ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ผู้รับจ้างหรือบุคลากร จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของผู้ว่าจ้าง เพื่อไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญ หรือส่งเสียดังรบกวนสมาชิกซึ่งเข้ามาใช้บริการภายในสถานที่ของผู้ว่าจ้าง

เรื่อง : โครงการสะพานทางเดินข้ามสนามหญ้าแข่งม้า Pavilion Walkway

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 1 เมษายน 2568

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

- 19.6 กรณีที่มีการจัดจ้างแรงงานต่างด้าว เพื่อเข้าปฏิบัติงานให้แก่ผู้ว่าจ้างตามสัญญาฉบับนี้ แรงงานต่างด้าวจะต้องมีเอกสารอนุญาตทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมายไทย
- 19.7 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ ไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้ว่าจ้างจนเกินสมควร
- 19.8 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการบริหารจัดการงานตามสัญญานี้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องส่งมอบแผนการใช้งานบุคลากร แผนการปฏิบัติงาน แผนการจัดส่งเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและอนุญาตเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
- 19.9 ผู้รับจ้างต้องจัดการขอใบอนุญาตต่างๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้
- 19.10 ผู้รับจ้างต้องไม่เปิดเผยข้อมูลลับของผู้ว่าจ้าง ซึ่งได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ และต้องใช้ข้อมูลลับเพื่อประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง ตามสัญญานี้เท่านั้น
- 19.11 ผู้รับจ้างรับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ว่าจ้าง และรับรองว่า การเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มาจากผู้รับจ้างได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือสามารถเปิดเผยแก่ผู้ว่าจ้างได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
- 19.12 ผู้รับจ้างรับทราบและจะปฏิบัติตามนโยบายการชี้เบาะแสของผู้ว่าจ้าง
- 19.13 กรณีที่ผู้รับจ้าง มีความจำเป็นหรือมีข้อคิดเห็นที่เห็นสมควรว่าจะต้องดำเนินการในจุดใดที่ไม่ตรงกับข้อกำหนด TOR ผู้รับจ้างจะต้องทำหนังสือแจ้งพร้อมชี้แจงเหตุผล ส่งมายังแผนกจัดซื้อทันที เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับงานได้พิจารณาและอนุมัติก่อน ผู้รับจ้างจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่ไม่ตรงกับข้อกำหนด TOR ได้ หากผู้รับจ้างดำเนินการใดที่ไม่ถูกต้องตรงกับข้อกำหนด TOR โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับงานก่อน ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำดังกล่าว อีกทั้ง ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาค่าปรับตามความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ว่าจ้างด้วย


อนุมัติโดย

ลง
3/4/68ลง
2/4/68

(คณะกรรมการประเมินโครงการ)

ทว.ลต

ตำแหน่งและระยะติดตั้ง

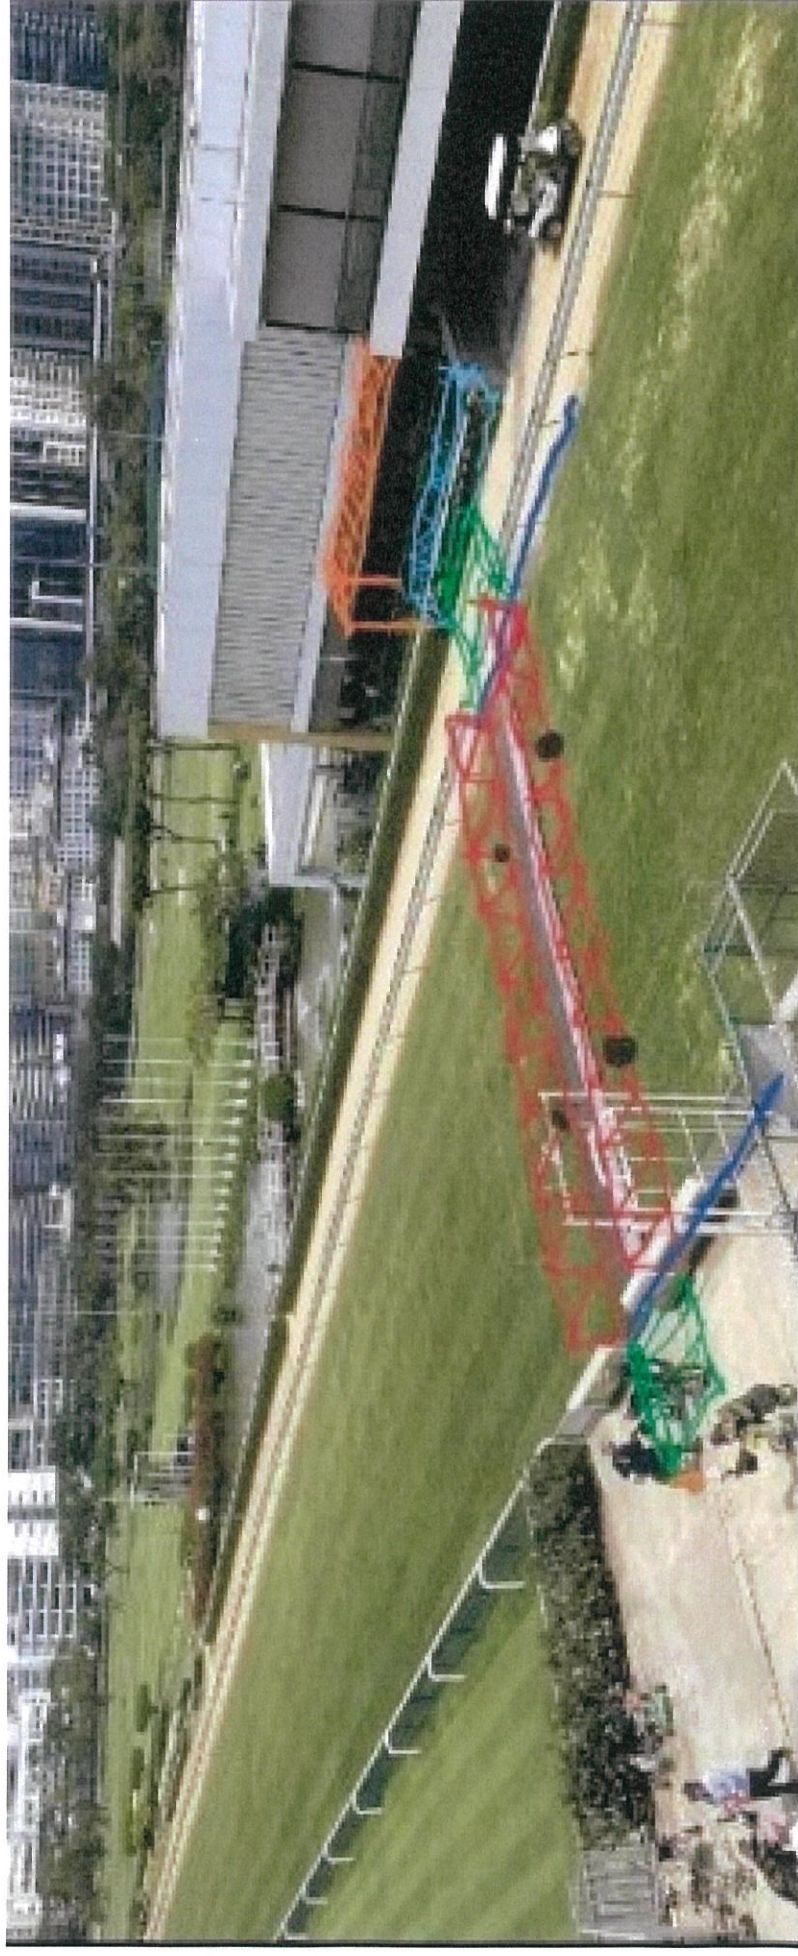


Prof.

พ.ร.บ.

พ.ร.บ.





ART




Along

side

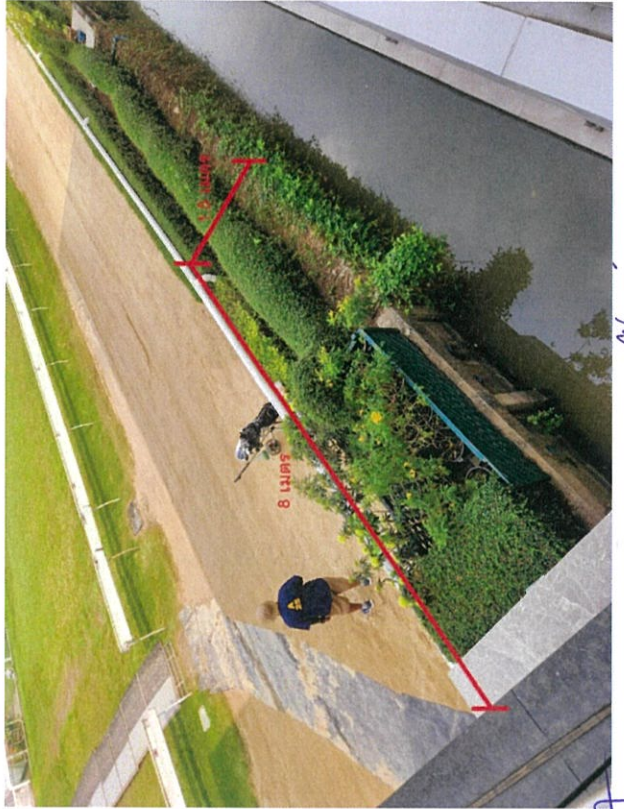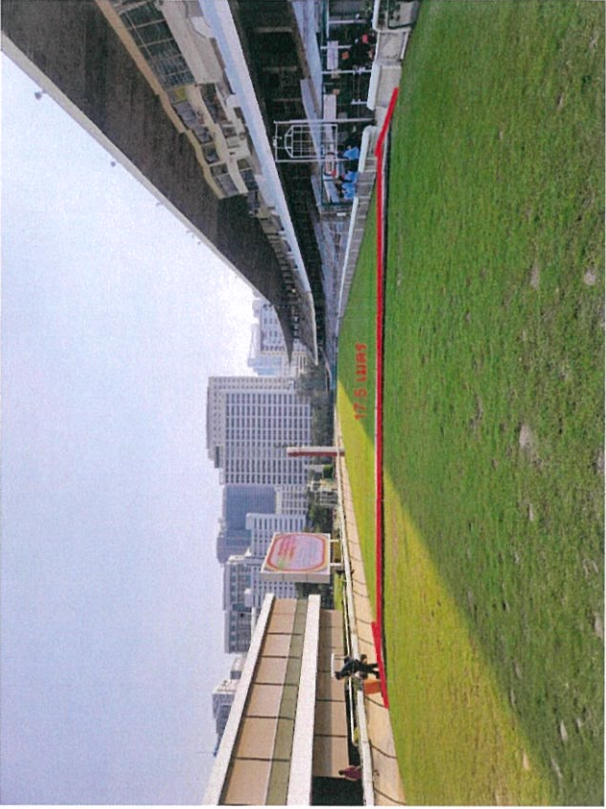

8 11005

40-10

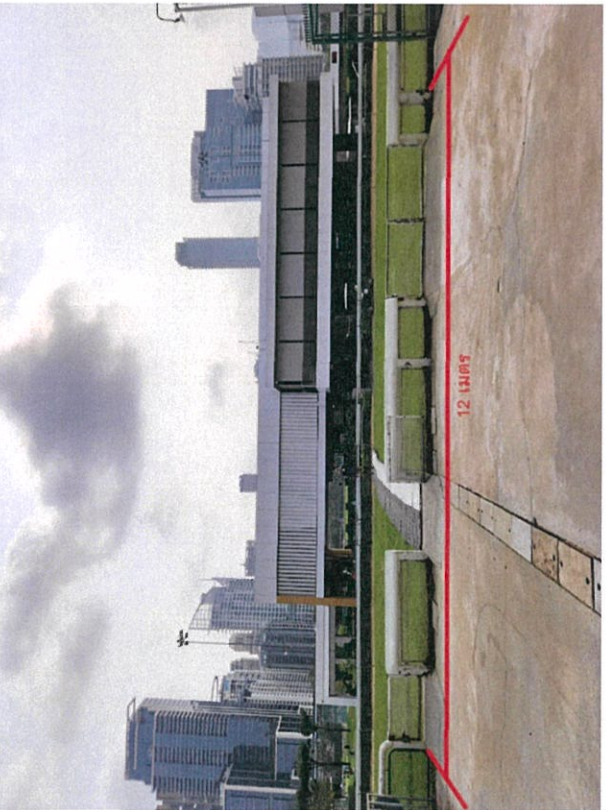

7 11005



Mong.

side

2.7

