

เรื่อง : งานเปลี่ยนท่อทางดูดทางส่งระบบปั๊มสระว่ายน้ำ 25 เมตรและ 50 เมตร สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 23 มกราคม 2569

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. งานเปลี่ยนท่อระบบปั๊มสระว่ายน้ำ 25 เมตรและ 50 เมตร สมาคมราชกรีฑาสโมสร

เนื่องด้วยระบบท่อ วาล์ว และอุปกรณ์ต่างภายในห้องปั๊มสระว่ายน้ำใช้งานอย่างต่อเนื่อง ท่อมีการแตก ร้าว น้ำรั่วไหล วาล์วเป็นสนิมชำรุดไม่สามารถปิดน้ำได้ สมาคมฯ จึงมีความประสงค์ที่จะปรับปรุง ท่อและวาล์ว ทางดูดทางส่งของระบบปั๊มสระว่ายน้ำ 25 เมตร และ 50 เมตร เพื่อให้ระบบของสระว่ายน้ำสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์ในการจัดซื้อจัดจ้าง

- 2.1. เพื่อเปลี่ยนทดแทนท่อและวาล์วของเดิมที่ชำรุดแตก ร้าว เป็นสนิม ไม่สามารถปิดวาล์วน้ำได้
- 2.2. เพื่อควบคุมและจัดการระบบสระว่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 3.1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีเงินทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยต้องยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
- 3.2. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างสระว่ายน้ำ ติดตั้งปั๊มน้ำ อุปกรณ์และระบบควบคุม หรือปรับปรุงสระ ว่ายน้ำโดยมีผลงานการย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องยื่น สำเนาเอกสารสัญญาหรือคำสั่งซื้อหรือหนังสือรับรองผลงานแนบมาในซองเทคนิค

4. ขอบเขตงาน

4.1 งานเปลี่ยนท่อทางดูดและทางส่งระบบปั๊มสระว่ายน้ำ 25 เมตร

- 4.1.1 งานตัดแยกระบบน้ำระหว่าง สระว่ายน้ำ 25 เมตรและระบบน้ำภายใน Surge Tank กับห้องปั๊ม สระ 25 เมตร โดยวิธีปิดกั้นท่อ/อุด/บอลลูนบล็อดน้ำ Surge Tank, Main drain, Vacuum Line, Floor Inlet เพื่อไม่ให้น้ำรั่วไหลลงภายในห้องปั๊มในขณะรื้อถอนและติดตั้งท่อ วาล์ว โดยวิธีที่เหมาะสม

หมายเหตุ ไม่เดรนน้ำทั้งหมดออกจากสระว่ายน้ำ

- 4.1.2 งานรื้อถอนระบบท่อน้ำ ท่อจ่ายสารเคมี วาล์ว และติดตั้งระบบท่อน้ำ ทางดูด/ทางส่ง ตั้งแต่ ระบบท่อออกถึงเก็บน้ำ (Surge Tank) เข้าสู่ท่อทางดูดปั๊ม (Suction Pump) ออกทางส่งปั๊ม

เรื่อง : งานเปลี่ยนท่อทางดูดทางส่งระบบปั๊มสระว่ายน้ำ 25 เมตรและ 50 เมตร สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 23 มกราคม 2569

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

(Discharge Pump) เข้าระบบกรอง (Suction Filter) ออกระบบกรอง (Discharge Filter / Drain Line) เข้าสู่สระว่ายน้ำ (Main drain, Vacuum Line, Floor Inlet) ท่อจ่ายสารเคมี วาล์ว ต่างๆ

- ท่อน้ำประปาชนิด PVC Class 13.5 คุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า
- อุปกรณ์ข้อต่อชนิด PVC Class 13.5 (ชนิดฉีดขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์) คุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า
- วาล์วขนาดตั้งแต่ 4 นิ้ว เป็นชนิด Butterfly Valve ลินสแตนเลส ยี่ห้อ KITZ คุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า
- ชนิดวาล์วขนาดไม่เกิน 3 นิ้ว เป็นชนิด Ball Valve U-PVC ยี่ห้อ KITZ คุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า
- ชนิดวาล์วก้นกลับขนาดตั้งแต่ 3 นิ้ว เป็นชนิด Wafer Check Valve ลินสแตนเลส ยี่ห้อ KITZ คุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า
- ชนิดวาล์วก้นกลับขนาดไม่เกิน 2 นิ้ว เป็นชนิด Swing Check Valve ลินสแตนเลส ยี่ห้อ KITZ คุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า
- ที่แขวนท่อ, ที่รองรับท่อ, น๊อต, สกรู, แหวน, พุก, นัท, โบลท์และที่รัดท่อ ทั้งหมดนี้ จะต้องเป็นชนิดสแตนเลส เกรด 316
- สีกันสนิม TOA Red oxide, สีเคลือบเงา TOA Glipton เทียบเท่าหรือดีกว่า

4.2 งานเปลี่ยนท่อทางดูดและทางส่งระบบปั๊มสระว่ายน้ำ 50 เมตร

4.2.1 งานตัดแยกระบบน้ำระหว่าง สระว่ายน้ำ 25 เมตรและระบบน้ำภายใน Surge Tank กับห้องปั๊มสระ 50 เมตร โดยวิธีปิดกั้นท่อ/อุด/บอลลูนบล็อคน้ำ Surge Tank, Main drain, Vacuum Line, Floor Inlet เพื่อไม่ให้น้ำรั่วไหลลงภายในห้องปั๊มในขณะรื้อถอนและติดตั้งท่อ วาล์ว โดยวิธีที่เหมาะสม

หมายเหตุ ไม่เตรนน้ำทั้งหมดออกจากสระว่ายน้ำ

4.2.2 งานรื้อถอนระบบท่อน้ำ ท่อจ่ายสารเคมี วาล์ว และติดตั้งระบบท่อน้ำ ทางดูด/ทางส่ง ตั้งแต่ระบบท่อออกถังเก็บน้ำ (Surge Tank) เข้าสู่ท่อทางดูดปั๊ม (Suction Pump) ออกทางส่งปั๊ม (Discharge Pump) เข้าสู่สระว่ายน้ำ (Main drain, Vacuum Line, Floor Inlet) ท่อจ่ายสารเคมี วาล์ว ต่างๆ

เรื่อง : งานเปลี่ยนท่อทางดูดทางส่งระบบปั๊มสระว่ายน้ำ 25 เมตรและ 50 เมตร สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 23 มกราคม 2569

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

- ท่อน้ำประปาชนิด PVC Class 13.5 คุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า
- อุปกรณ์ข้อต่อชนิด PVC Class 13.5 (ชนิดฉีดขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์) คุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า
- วาล์วขนาดตั้งแต่ 4 นิ้ว เป็นชนิด Butterfly Valve ลินสแตนเลส ยี่ห้อ KITZ คุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า
- ชนิดวาล์วขนาดไม่เกิน 3 นิ้ว เป็นชนิด Ball Valve U-PVC ยี่ห้อ KITZ คุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า
- ชนิดวาล์วก้นกลับขนาดตั้งแต่ 3 นิ้ว เป็นชนิด Wafer Check Valve ลินสแตนเลส ยี่ห้อ KITZ คุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า
- ชนิดวาล์วก้นกลับขนาดไม่เกิน 2 นิ้ว เป็นชนิด Swing Check Valve ลินสแตนเลส ยี่ห้อ KITZ คุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า
- ที่แขวนท่อ, ที่รองรับท่อ, น๊อต, สกรู, แหวน, พุก, นัท, โบลท์และที่รัดท่อ ทั้งหมดนี้จะต้องเป็นชนิดสแตนเลส เกรด 316
- สีกันสนิม TOA Red Oxide, สีเคลือบเงา TOA Glipton เทียบเท่าหรือดีกว่า

4.3 งานบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ

4.3.1 ก่อนดำเนินงาน ตรวจวัดค่าคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำก่อนดำเนินงาน

4.3.2 ขณะดำเนินงาน ตัดแยกระบบสระว่ายน้ำเพื่อดำเนินการ ผู้รับจ้างต้องติดตั้งชุดระบบกรองน้ำระบบจ่ายสารเคมี ระบบปั๊ม ชนิดเคลื่อนที่ (ชั่วคราว) เพื่อให้คุณภาพน้ำเป็นไปตาม คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550

(pH 7.2 – 8.4), (Residual Chlorine 1.5 – 2.5 ppm)

โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดผู้รับจ้างต้องเป็นผู้บริหารจัดการคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำในขณะดำเนินงาน

หมายเหตุ

สระว่ายน้ำ 21x50เมตร มีปริมาตร 1,730 ลูกบาศก์เมตร (Surge Tank 50 ลูกบาศก์เมตร)

สระว่ายน้ำ 15x25เมตร มีปริมาตร 507 ลูกบาศก์เมตร (Surge Tank 25 ลูกบาศก์เมตร)

4.3.3 หลังดำเนินงาน ตรวจวัดค่าคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำหลังดำเนินงาน หากคุณภาพน้ำไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการปรับคุณภาพน้ำให้อยู่ในค่ามาตรฐาน

เรื่อง : งานเปลี่ยนท่อทางดูดทางส่งระบบปั้มสระว่ายน้ำ 25 เมตรและ 50 เมตร สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 23 มกราคม 2569

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

- 4.4 ผู้รับจ้างต้องสำรวจแนวท่อน้ำ อุปกรณ์ วาล์วโดยละเอียด พร้อมแนวทางการตัดแยกระบบในการดำเนินการอย่างเหมาะสมและปลอดภัยพร้อมแนบข้อมูลในของเทคนิค
- 4.5 ตำแหน่งท่อทางดูดและทางส่งระบบปั้มสระว่ายน้ำ ให้อ้างอิงจากตำแหน่งตามแบบเดิมและต้องสะดวกต่อการเข้าปฏิบัติงานประจำวัน Operation หรืองานบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ
- 4.6 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการทดสอบรอยรั่วอย่างละเอียดหลังจากดำเนินการติดตั้งท่อทางดูด/ทางส่งและอุปกรณ์ต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- 4.7 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำเอกสารแสดงการรับประกันผลงาน โดยกำหนดให้มีอายุการรับประกันอย่างน้อย 1 ปี รวมอะไหล่และบริการ
- 4.8 ท่อ วาล์ว และซากอุปกรณ์ที่ถูกถอนผู้รับจ้างต้องเสนอราคารับซื้อซากและนำออกจากสมาคมฯ
- 4.9 ประตูทางเข้า-ออก ที่สามารถนำท่อ วาล์ว อุปกรณ์และเครื่องมือเข้าติดตั้งทำงาน มีความกว้าง 1.15 เมตร

5. เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

5.1 เวลาปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง

- 5.1.1 สระว่ายน้ำ 25 เมตร ปิดสระว่ายน้ำเพื่อดำเนินการ 5 วัน
- 5.1.2 สระว่ายน้ำ 50 เมตร ปิดสระว่ายน้ำเพื่อดำเนินการ 10 วัน
- 5.1.3 การปิดสระว่ายน้ำต้องได้รับการอนุญาตจากแผนกกีฬาเท่านั้น ก่อนจะเริ่มดำเนินการตามแผนงาน โดยปิดได้ที่สระ

5.2 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและด้านความปลอดภัย ดังต่อไปนี้

- 5.2.1 ขั้นตอนการอบรมก่อนเริ่มงานตามกฎหมาย ผู้รับจ้างต้องผ่านการอบรมก่อนเข้าทำงานตามกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจากทางสมาคมฯ
- 5.2.2 ขั้นตอนเอกสารก่อนเข้าเริ่มงาน ผู้รับจ้างต้องจัดทำเอกสารงานด้านความปลอดภัยต่างๆส่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยก่อนเข้าทำงาน อาทิ
 - 5.2.2.1 แบบวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและมาตรการควบคุม JSA
 - 5.2.2.2 แบบฟอร์มขอทำบัตรอนุญาตรายชื่อผู้เข้าปฏิบัติงาน
 - 5.2.2.3 ใบขออนุญาตทำงานประเภทต่างๆ Work Permit
 - 5.2.2.4 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้รับจ้าง PPE
 - 5.2.2.5 รายการเครื่องมือ/เครื่องจักร ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง

เรื่อง : งานเปลี่ยนท่อทางดูดทางส่งระบบปั๊มสระว่ายน้ำ 25 เมตรและ 50 เมตร สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 23 มกราคม 2569

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

5.2.2.6 รายชื่อผู้รับผิดชอบงาน เช่น วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
พร้อมแนบเอกสารใบประกอบวิชาชีพหรือใบรับรองตามที่กฎหมายกำหนด

5.2.3 ขั้นตอนปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติดังนี้

5.2.3.1 นำรายการและอุปกรณ์เครื่องมือ/เครื่องจักร รวมถึงอุปกรณ์ดับเพลิง พร้อมให้เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยของทางสมาคมฯ ตรวจสอบอยู่ในสภาพปลอดภัยพร้อมใช้งาน

5.2.3.2 ผู้รับจ้างต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ตามลักษณะของงาน
อย่างเคร่งครัด

5.2.3.3 กั้นขอบเขตพื้นที่การปฏิบัติงานพื้นที่เสี่ยงและติดตั้งป้ายเตือนอันตราย

5.2.3.4 ห้ามสูบบุหรี่ทุกพื้นที่ ยกเว้นพื้นที่สูบบุหรี่ที่จัดไว้ให้เท่านั้น

5.2.3.5 ห้ามถ่ายภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต

5.2.3.6 รับประทานอาหารและใช้ห้องน้ำในพื้นที่ที่จัดไว้ให้เท่านั้น

5.2.3.7 ห้ามเล่นการพนัน ห้ามทะเลาะวิวาท ห้ามพกพาสิ่งเสพติด อาวุธ ของมีคมเมาหรือสิ่งผิด
กฎหมายเข้ามาในพื้นที่สมาคมฯ

5.3 ผู้รับจ้างต้องขนย้ายเศษวัสดุเดิมให้จัดเก็บภายในพื้นที่สมาคมฯ ตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนด

5.4 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุจากสะเก็ดไฟเชื่อมทุกพื้นที่การทำงาน

5.5 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือ นั่งร้าน บันได หรืออุปกรณ์อื่นๆ ให้พร้อมสำหรับการ
ทำงาน ไม่สามารถนำอุปกรณ์ของทางสมาคมฯ ไปใช้งานได้

5.6 กรณีผู้รับจ้างทำความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวอาคาร พื้น ผนัง หรืออื่นๆ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้แล้ว
เสร็จก่อนส่งมอบงาน

5.7 ผู้รับจ้างต้องดูแลเรื่องความสะอาดของสถานที่ รวมทั้งจัดเก็บและขนย้ายเศษวัสดุจากการทำงาน
นำออกไปทิ้งภายนอกสมาคมฯ ทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ใช้งานของอาคาร
สถานที่ทุกวัน

5.8 ผู้รับจ้างต้องส่งแผนงานและรายงานประเมินความเสี่ยงในการทำงานให้กับผู้ควบคุมงาน ก่อนเข้า
ทำงานล่วงหน้า 14 วัน

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาในการดำเนินการภายใน 120 วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน) นับจากแผนงานที่ได้รับการอนุมัติ

เรื่อง : งานเปลี่ยนท่อทางดูดทางส่งระบบปั๊มสระว่ายน้ำ 25 เมตรและ 50 เมตร สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 23 มกราคม 2569

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

7. งานที่ต้องส่งมอบ

- 7.1 งานปรับปรุงอุปกรณ์สระว่ายน้ำ 25 เมตรและ 50 เมตร (ตามข้อ 4.) จำนวน 1 งาน
- 7.2 เล่มรายงานภาพถ่ายการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานจนแล้วเสร็จ จำนวน 2 เล่ม
- 7.3 บัญชีรายชื่อท่อ ข้อต่อ วาล์วและอุปกรณ์ Equipment and Machine List จำนวน 2 เล่ม
- 7.4 คู่มือการใช้งาน Operation Manual จำนวน 2 เล่ม
- 7.5 ผลการทดสอบคุณภาพน้ำ จำนวน 2 เล่ม
- 7.6 หนังสือรับประกันผลงาน จำนวน 2 ชุด
- 7.7 หนังสือส่งมอบ จำนวน 2 ชุด
- 7.8 แบบ As-Built Drawing (.DWG) งานติดตั้ง A3 จำนวน 2 ชุด
- 7.9 ไฟล์เอกสารส่งมอบงานทั้งหมดบันทึกลงแฟลชไดรฟ์ จำนวน 1 ชุด

8. การยื่นข้อเสนอ

ผู้เสนอราคาต้องยื่นซองข้อเสนอโครงการที่ปิดผนึกเรียบร้อย โดยยื่นแยกเป็น 2 ซอง ได้แก่

8.1.ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

- 8.1.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 8.1.2 สำเนาภ.พ. 20 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 8.1.3 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
- 8.1.4 หนังสือยอมรับเงื่อนไขและคุณสมบัติที่ทางสมาคมฯ กำหนด
- 8.1.5 แผนการทำงานไม่เกิน 120 วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน) นับจากแผนงานที่ได้รับการอนุมัติ
- 8.1.6 ข้อมูลคุณสมบัติของท่อ ข้อต่อ วาล์ว และอุปกรณ์
- 8.1.7 แผนงานขั้นตอน/วิธี/แนวทาง ตัดแยกระบบน้ำ (ระบุระยะเวลา ต่อสระ)
- 8.1.8 แผนงานแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพสระว่ายน้ำระหว่างตัดแยกระบบ
- 8.1.9 เอกสารอ้างอิงผลงาน เช่น เอกสารสัญญา หรือ ใบสั่งซื้อ หรือ หนังสือรับรองงานติดตั้งระบบสระว่ายน้ำ งานระบบท่อสุขาภิบาล หรือผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างในครั้งนี้อยู่ โดยมีผลงาน ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา

เรื่อง : งานเปลี่ยนท่อทางคูทางส่งระบบปั๊มสระว่ายน้ำ 25 เมตรและ 50 เมตร สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 23 มกราคม 2569

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

8.2.ของข้อเสนอมหาทางด้านราคา จำนวน 1 ชุดประกอบด้วย

เอกสารเสนอราคาจะระบุเป็นปริมาณงานต่อหน่วย โดยต้องยื่นราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ส่งใบเสนอราคา ตามรายละเอียดขอบเขตงานข้อ 4. พร้อมระบุรายละเอียดวงงานและเงื่อนไขการชำระเงิน

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องระบุที่หน้าซองด้วยว่าเป็น "ซองข้อเสนอมหาทางด้านเทคนิค" หรือ "ซองข้อเสนอมหาทางด้านราคา" ปิดผนึกซองให้เรียบร้อย และยื่นต่อแผนกจัดซื้อ สมาคมราชกรีฑาสโมสร 02-028-7272 ต่อ 1292

9. หลักประกัน

9.1 ผู้เสนอราคา หากได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันสัญญา (Performance Bond) จำนวน 10% ของมูลค่างานตามสัญญา โดยเป็นหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

9.1.1 เงินสด

9.1.2 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ

9.1.3 แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายสมาคมฯ ระบุวันที่ชัดเจน

โดยทางสมาคมฯ จะถือไว้ใช้เป็นหลักประกันตลอดระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จ โดยหลักประกันนี้จะคืนให้กับผู้รับจ้างเมื่อดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จโดยไม่มีดอเบี้ย

9.2 ผู้รับจ้างจะต้องทำประกันภัยบุคคลที่ 3 ขณะเข้าปฏิบัติงานในสมาคมฯ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยมีวงเงินคุ้มครองตามมูลค่าสัญญา และจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้กับสมาคมฯ ก่อนเริ่มดำเนินการ

9.3 ผู้รับจ้างจะต้องมีประกันอุบัติเหตุให้กับผู้ปฏิบัติงาน ครอบคลุมความปลอดภัยขณะเข้าปฏิบัติงานในสมาคมฯ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และจัดส่งกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุหรือสำเนากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ (กรณีที่ผู้รับจ้างได้ทำประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มสำหรับลูกจ้างไว้แล้ว) ให้กับสมาคมฯ ก่อนเริ่มดำเนินการ

10. การรับประกันสินค้า

ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องของงานเป็นระยะเวลา 1 ปี รวมอะไหล่และบริการ โดยนับจากวันที่สมาคมฯ รับมอบงาน กรณีเกิดเหตุชำรุด บกพร่อง ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขการชำรุดภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง โดยไม่มี ค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดระยะเวลารับประกัน

เรื่อง : งานเปลี่ยนท่อทางคูทางส่งระบบปั๊มสระว่ายน้ำ 25 เมตรและ 50 เมตร สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 23 มกราคม 2569

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

11. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

สมาคมฯ จะจ่ายเงินครบทั้งจำนวนหรือตามงวดงานที่ได้ตกลงกัน ภายใน 30 วันหรือตามที่ได้ตกลงกัน นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับลงนามรับมอบงาน และผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามกระบวนการวางบิลของสมาคมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

12. กระบวนการพิจารณาข้อเสนอ

- 12.1 สมาคมฯ จะพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิคของผู้ยื่นซองทุกราย โดยข้อเสนอทางเทคนิคที่ผ่านการพิจารณาต้องสอดคล้องกับความต้องการของสมาคมฯ ที่ระบุในขอบเขตของงาน และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน
- 12.2 สมาคมฯ จะเปิดซองข้อเสนอด้านราคาของผู้ยื่นซองเฉพาะรายที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคที่สอดคล้องกับความต้องการของสมาคมฯ ที่ระบุในขอบเขตของงาน และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน
- 12.3 สมาคมฯ จะพิจารณาคุณสมบัติ ราคา และคุณภาพงาน และดำเนินการเจรจาต่อรองราคากับผู้ยื่นซองที่มีข้อเสนอทางเทคนิค และข้อเสนอทางด้านราคาที่ต่ำที่สุด
- 12.4 หากการเจรจาไม่เป็นผล สมาคมฯ จะพิจารณายกเลิกการเจรจาต่อรองกับผู้ยื่นซองรายนั้น และจะพิจารณาผู้ยื่นซองที่มีข้อเสนอทางเทคนิค และข้อเสนอทางด้านราคาที่ต่ำรองลงมา และดำเนินการเช่นเดียวกับรายแรก จนกว่าจะได้ราคาที่เหมาะสม และอยู่ในงบประมาณ
- 12.5 ผู้ยื่นซองต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นซองรายอื่นที่เข้าเสนอราคาแก่สมาคมฯ ณ วันเสนอราคานี้ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม
- 12.6 การปฏิบัติและเอกสารที่เสนอทั้งหมดครบถ้วน และถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของการเสนอราคา สมาคมฯจะไม่พิจารณาราคาของผู้เข้าเสนอราคาที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของการเสนอราคา และ/หรือเอกสารไม่ครบถ้วน
- 12.7 พิจารณาความเหมาะสมทางเทคนิค ตามรายละเอียดในข้อ 8.1
- 12.8 พิจารณาความเหมาะสมของราคางานจ้างเหมาก่อสร้างงานที่เสนอ ทั้งนี้โดยไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องรับราคาของผู้เสนอราคาต่ำสุด หรือต่ำกว่า
- 12.9 สมาคมฯ มีสิทธิที่จะเรียกผู้เข้าเสนอราคารายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายมาต่อรองราคาก็ได้ตามที่เห็นเหมาะสม
- 12.10 สมาคมฯ จะพิจารณาความเหมาะสมทางเทคนิค ควบคู่ไปกับกับความเหมาะสมทางด้านราคา

เรื่อง : งานเปลี่ยนท่อทางดูทางส่งระบบปั๊มสระว่ายน้ำ 25 เมตรและ 50 เมตร สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 23 มกราคม 2569

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

12.11 สมาคมฯ สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธผู้เข้าเสนอราคาขายใดรายหนึ่ง หรือหลายราย หรือทั้งหมด และมีสิทธิจะยกเลิกการเสนอราคาทั้งหมด

12.12 สมาคมฯ มีสิทธิที่จะไม่พิจารณาการเสนอราคาที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข และระเบียบการเสนอราคาดังกล่าวข้างต้น เว้นแต่การรับราคาที่ผิดเงื่อนไขนั้นจะเป็นประโยชน์แก่งานของโครงการฯ และสมาคมฯ พิจารณาเห็นสมควรรับไว้พิจารณา

12.13 สมาคมฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดได้ และอาจพิจารณาเลือกเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาเลยก็ได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของสมาคมฯ เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของสมาคมฯ เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นของจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้

13. ระยะเวลาการพิจารณาข้อเสนอ

13.1 กำหนดประชุมชี้แจงรายละเอียดและดูสภาพหน้างานวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Member Box

13.2 กำหนดยื่นซองภายในวันที่ 5 มีนาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ณ แผนกจัดซื้อ สมาคมราชกรีฑาสโมสร ติดต่อคุณกุลวดี โทร. 02-028-7272 ต่อ 1292

14. ความรับผิดชอบต่อความเสียหาย

14.1 การบอกเลิกสัญญา

14.1.1 สมาคมฯ มีสิทธิในการบอกเลิกสัญญาได้ในกรณีที่การเข้าดำเนินงานของผู้รับจ้างไม่ตรงกับที่กำหนดโดย สมาคมฯ จะแจ้งการบอกเลิกสัญญาล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน และมีสิทธิรับหนังสือค้ำประกัน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงจะไม่เรียก จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ต่อผู้ว่าจ้าง ไม่ว่าจะเป็นไปตามกฎหมายหรือตามสัญญา

14.1.2 หากการดำเนินงานของผู้รับจ้างไม่มีความคืบหน้าภายในเวลาอันสมควร หรือมีแนวโน้มที่เชื่อว่า จะใจจะทำงานล่าช้า หรือละทิ้งงาน หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งก็ดี หรือผู้รับจ้างเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของสมาคมฯ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากสมาคมฯ สมาคมฯ สงวนสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาและว่าจ้างผู้รับจ้างรายอื่นที่ สมาคมฯ พิจารณาว่าสมควรมาดำเนินการส่วนที่เหลือ โดยสมาคมฯ สงวนสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากผู้รับจ้าง

เรื่อง : งานเปลี่ยนท่อทางดูดทางส่งระบบปั้มสระว่ายน้ำ 25 เมตรและ 50 เมตร สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 23 มกราคม 2569

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

14.1.3 ผู้รับจ้างรับทราบว่าจะระมัดระวังข้อมูล และ/หรือเอกสารใดๆ ที่ผู้รับจ้างได้รับเกี่ยวกับโครงการนี้ให้ถือเป็นความลับของสมาคมฯ โดยผู้รับจ้างตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลหรือรายละเอียดต่างในการดำเนินงาน และ จะต้องรักษาความลับของสมาคมฯ และความลับในการให้คำปรึกษา หากมีการละเมิด ทางสมาคมฯ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายและยกเลิกสัญญาการจัดจ้างได้ โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

15. การจ้างช่วงหรือการโอนงานให้ผู้อื่น

ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างไม่อาจจะโอนงานทั้งหมดหรือบางส่วนให้บุคคลอื่น หรือทำการจ้างช่วงโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง และหากผู้รับจ้างฝ่าฝืน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ การโอนงานดังระบุข้างต้นนั้น แม้ผู้รับจ้างได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างก็ตาม ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบในการกระทำใดๆ ของผู้รับจ้างช่วง ตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงต่อ ผู้ว่าจ้างตามสัญญาฉบับนี้

16. หน้าที่ทางภาษีของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าภาษี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และอากรแสตมป์ใดๆ ที่เกี่ยวกับการว่าจ้างของโครงการนี้

17. บทปรับ

17.1 กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ สมาคมฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ หากผู้รับจ้างได้เริ่มงานใดๆ อันส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อทรัพย์สินของสมาคมฯ ก่อนการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อให้ทรัพย์สินของสมาคมฯ ดังกล่าวกลับสู่สภาพเดิม

17.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้ากว่าที่กำหนด สมาคมฯ จะดำเนินการคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง) ต่อวัน ของมูลค่างานตามสัญญา ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน หรือทำงานไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา แต่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้

เรื่อง : งานเปลี่ยนท่อทางดูทางส่งระบบปั๊มสระว่ายน้ำ 25 เมตรและ 50 เมตร สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 23 มกราคม 2569

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

17.2.1 ปรับเป็นรายวันตามจำนวนที่สมาคมฯ ระบุไว้ นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างรับมอบงานแล้วตามสัญญา

17.2.2 เรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าทั้งทางตรงและทางอ้อม (ถ้ามี)

17.2.3 เรียกค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน เมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานนั้นอีกต่อหนึ่ง นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงาน และผู้ว่าจ้างรับมอบงาน โดยคิดตามอัตราที่สมาคมฯ ระบุ

อัตราค่าปรับตามจุดตรวจสอบผลงานของโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานในโครงการจะแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา โครงการฯ อาจกำหนดให้มีจุดตรวจสอบผลงานในระหว่างการก่อสร้าง ตามที่สมาคมฯ ระบุอัตราค่าปรับตามจุดตรวจสอบผลงานของโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานในโครงการจะแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาโครงการฯ อาจกำหนดให้มีจุดตรวจสอบผลงานในระหว่างการก่อสร้าง ตามที่สมาคมฯ ระบุ

17.2.4 ซึ่งหากปรากฏว่าเมื่อถึงวัน เวลา ในจุดตรวจสอบที่ 1 ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการตามผลงานที่กำหนด ให้ถือเป็นดุลพินิจของผู้ว่าจ้างในการพิจารณาว่าผู้รับจ้างมีแนวโน้มที่จะทำงานไม่แล้วเสร็จ และไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนดสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินตามที่สมาคมฯ ระบุ และให้ผู้รับจ้างปรับปรุงแผนการดำเนินงานเสนอขออนุมัติต่อผู้ว่าจ้างใหม่ภายใน 7 (เจ็ด) วัน

ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินค่าปรับในจุดตรวจสอบที่ 1 ให้กับผู้รับจ้าง หากผู้รับจ้างสามารถเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จในจุดตรวจสอบที่ 2 ตามที่กำหนดในสัญญา แต่หากผู้รับจ้างไม่สามารถเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จในจุดตรวจสอบที่ 2 ตามที่กำหนดในสัญญา ให้ถือเป็นดุลพินิจของผู้ว่าจ้างในการพิจารณาว่าผู้รับจ้างมีแนวโน้มที่จะทำงานไม่แล้วเสร็จ และไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนดสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินตามที่สมาคมฯ ระบุ และให้ผู้รับจ้างปรับปรุงแผนการดำเนินงานเสนอขออนุมัติต่อผู้ว่าจ้างใหม่ภายใน 7 (เจ็ด) วัน อีกครั้ง และเช่นเดียวกันในจุดต่อไป

หากผู้รับจ้างสามารถเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามที่กำหนดในสัญญา ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินค่าปรับในจุดตรวจสอบที่ 1, 2 และ/หรือจุดต่อไป ให้กับผู้รับจ้าง แต่หากผู้รับจ้างไม่สามารถเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จตามที่กำหนดในสัญญา ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะยึดเงินค่าปรับในจุดตรวจสอบที่ 1, 2 และ/หรือจุดต่อไปนี้หรือไม่ก็ได้ นอกเหนือจากเงินค่าปรับตามข้อ 17.2.1

เรื่อง : งานเปลี่ยนท่อทางดูดทางส่งระบบปั๊มสระว่ายน้ำ 25 เมตรและ 50 เมตร สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 23 มกราคม 2569

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

18. การเพิ่มหรือลดปริมาณงานและเปลี่ยนแปลงรายการงานก่อสร้าง

- 18.1 การเพิ่มหรือลดปริมาณงาน ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะสั่งการให้เพิ่มหรือลดปริมาณงานรายการหนึ่งรายการใดหรือหลายๆ รายการ ในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดงานดังกล่าวจะใช้ราคาต่อหน่วยที่กำหนดในสัญญาเป็นราคาในการคำนวณหาจำนวนเงินที่เปลี่ยนแปลง
- 18.2 การเปลี่ยนแปลงรายการในสัญญาจ้างเหมานี้ ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะเพิ่มหรือยกเลิกรายการใดรายการหนึ่งรายการใดก็ได้
- 18.3 วิธีการปฏิบัติต่อการคำนวณค่าดำเนินงานสำหรับรายการที่เพิ่มเติมในข้อ 11.2 ในกรณีไม่มีราคาต่อหน่วยที่กำหนดในสัญญา
 - 18.3.1 โดยเจรจาต่อรองราคาแบบเหมาจ่าย และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารโครงการ หรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง
 - 18.3.2 โดยเจรจาต่อรองราคากันแบบราคาต่อหน่วย และสำรวจปริมาณวัสดุที่เปลี่ยนแปลงตามที่ได้ดำเนินงานจริงจ่ายให้กับผู้รับจ้าง และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารโครงการ หรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง
 - 18.3.3 การวัดปริมาณวัสดุ และงานเพิ่มลดที่เปลี่ยนแปลง ยึดถือจากมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์
 - 18.3.4 การพิจารณาตัดงานบางส่วนหรือทั้งหมด หากทางสมาคมฯพิจารณาเห็นแล้วว่างานบางส่วนหรือทั้งหมดจะไม่แล้วเสร็จทันตามแผนงาน ทางโครงการมีสิทธิที่จะมอบหมายให้ผู้รับจ้างรายอื่นเข้ามาดำเนินการในงานบางส่วนที่ล่าช้าอยู่ได้ โดยผู้เสนอราคายังคงต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในกรณีที่การว่าจ้างรายการเหล่านั้นให้ผู้รับจ้างรายอื่นมีมูลค่าการจ้างสูงกว่าตามสัญญา และผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิในการเรียกร้องค่าชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมทั้งต้องยินยอมและให้ความสะดวกกับผู้รับจ้างรายอื่นที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งขึ้นใหม่เข้ามาปฏิบัติงานโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

19 การป้องกันด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

- 19.1 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาแก่สมาคมฯ ณ วันเสนอราคานี้ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม
- 19.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับคณะกรรมการประเมินโครงการนี้

เรื่อง : งานเปลี่ยนท่อทางดูดทางส่งระบบปั๊มสระว่ายน้ำ 25 เมตรและ 50 เมตร สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 23 มกราคม 2569

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

20. คำรับรองของผู้รับจ้าง

- 20.1 ผู้รับจ้างจะจัดจ้างบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะสอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 20.2 ผู้รับจ้างจะดำเนินการโดยเลือกใช้วัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีคุณภาพดี ปลอดภัยต่อการใช้งาน และได้มาตรฐานสำหรับงานที่จ้างตามสัญญา
- 20.3 ผู้รับจ้างจะจัดการเปลี่ยนบุคลากรมาปฏิบัติงานทดแทนทันที ในกรณีบุคลากรของผู้รับจ้างมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือปฏิบัติงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ว่าจ้างโดยทันที
- 20.4 ผู้รับจ้างจะไม่โอนสิทธิหรือหน้าที่ใดๆ ตามสัญญาให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้าง
- 20.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างหรือบุคลากรของผู้รับจ้างจะเข้ามาปฏิบัติงานตามสัญญานี้ภายในสถานที่ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ผู้รับจ้างหรือบุคลากร จะต้องปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของผู้ว่าจ้าง เพื่อไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญ หรือส่งเสียงดังรบกวนสมาชิกซึ่งเข้ามาใช้บริการภายในสถานที่ของผู้ว่าจ้าง
- 20.6 กรณีที่มีการจัดจ้างแรงงานต่างด้าว เพื่อเข้าปฏิบัติงานให้แก่ผู้ว่าจ้างตามสัญญาฉบับนี้ แรงงานต่างด้าวจะต้องมีเอกสารอนุญาตทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมายไทย
- 20.7 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ ไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้ว่าจ้างจนเกินสมควร
- 20.8 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการบริหารจัดการงานตามสัญญานี้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องส่งมอบแผนการใช้งานบุคลากร แผนการปฏิบัติงาน แผนการจัดส่งเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและอนุญาตเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วัน
- 20.9 ผู้รับจ้างต้องจัดการขอใบอนุญาตต่างๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้
- 20.10 ผู้รับจ้างต้องไม่เปิดเผยข้อมูลลับของผู้ว่าจ้าง ซึ่งได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ และต้องใช้ข้อมูลลับเพื่อประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง ตามสัญญานี้เท่านั้น
- 20.11 ผู้รับจ้างรับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ว่าจ้าง และรับรองว่า การเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มาจากผู้รับจ้างได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือสามารถเปิดเผยแก่ผู้ว่าจ้างได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
- 20.12 ผู้รับจ้างรับทราบและจะปฏิบัติตามนโยบายการชี้เบาะแสของผู้ว่าจ้าง
- 20.13 กรณีที่ผู้รับจ้างมีความจำเป็นหรือมีข้อคิดเห็นที่เห็นสมควรว่าจะต้องดำเนินการในจุดใดที่ไม่ตรงกับข้อกำหนด TOR ผู้รับจ้างจะต้องทำหนังสือแจ้งพร้อมชี้แจงเหตุผล ส่งมายังแผนกจัดซื้อทันที เพื่อให้

เรื่อง : งานเปลี่ยนท่อทางคูทางส่งระบบปั๊มสระว่ายน้ำ 25 เมตรและ 50 เมตร สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 23 มกราคม 2569

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

คณะกรรมการตรวจรับงานได้พิจารณาและอนุมัติก่อน ผู้รับจ้างจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่ไม่ตรงกับข้อกำหนด TOR ได้ หากผู้รับจ้างดำเนินการใดที่ไม่ถูกต้องตรงกับข้อกำหนด TOR โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับงานก่อน ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำดังกล่าว อีกทั้ง ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาค่าปรับตามความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ว่าจ้างด้วย

20.14 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎกระทรวง และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการก่อสร้าง ตลอดจนการชำระภาษีทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของผู้รับจ้างตามเงื่อนไข โดยผู้รับจ้าง และ/หรือผู้รับจ้างทุกทอดจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากผู้รับจ้างและ/หรือผู้รับจ้างช่วงสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง และ/หรือ บุคคลภายนอก ผู้รับจ้างและ/หรือผู้รับจ้างช่วงตกลงจะรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดให้แก่ผู้ว่าจ้าง และ/หรือ บุคคลภายนอกดังกล่าว

21. ภาษาและกฎหมายที่จะใช้บังคับ

- 21.1 ภาษาที่ใช้ในการติดต่อระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างให้ใช้ภาษาไทย แต่สำหรับผู้รับจ้างกับผู้ควบคุมงาน การติดต่อจะใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ตามที่ผู้ควบคุมงานต้องการ
- 21.2 เอกสารการเสนอราคา สัญญา และเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง และหนังสือคำประกันให้ทำเป็นภาษาไทย เว้นแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นสมควรให้ทำเป็นภาษาอังกฤษ
- 21.3 รายการก่อสร้าง (Specification) แบบก่อสร้าง (Drawing) และเอกสารทางเทคนิคอื่นๆ อาจทำเป็นภาษาอังกฤษได้ ในกรณีที่ความหมายของภาษาทั้งสองเกิดขัดแย้งกันในเอกสารใดๆ ให้ถือความหมายตามภาษาไทยเป็นสำคัญ ยกเว้นคำทางเทคนิคให้ถือความตามภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ
- 21.4 ข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งอันเกี่ยวกับการศึกษาตีความสัญญานี้ก็ดี หรือเกี่ยวกับเรื่อง หรือสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากสัญญานี้ หรือเกี่ยวกับสัญญานี้ก็ดีให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย

อนุมัติโดย


(คณะกรรมการประเมินโครงการ)




เรื่อง : งานเปลี่ยนท่อทางดูดทางส่งระบบปั๊มสระว่ายน้ำ 25 เมตรและ 50 เมตร สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 23 มกราคม 2569

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

ตำแหน่งห้องปั๊มสระว่ายน้ำ

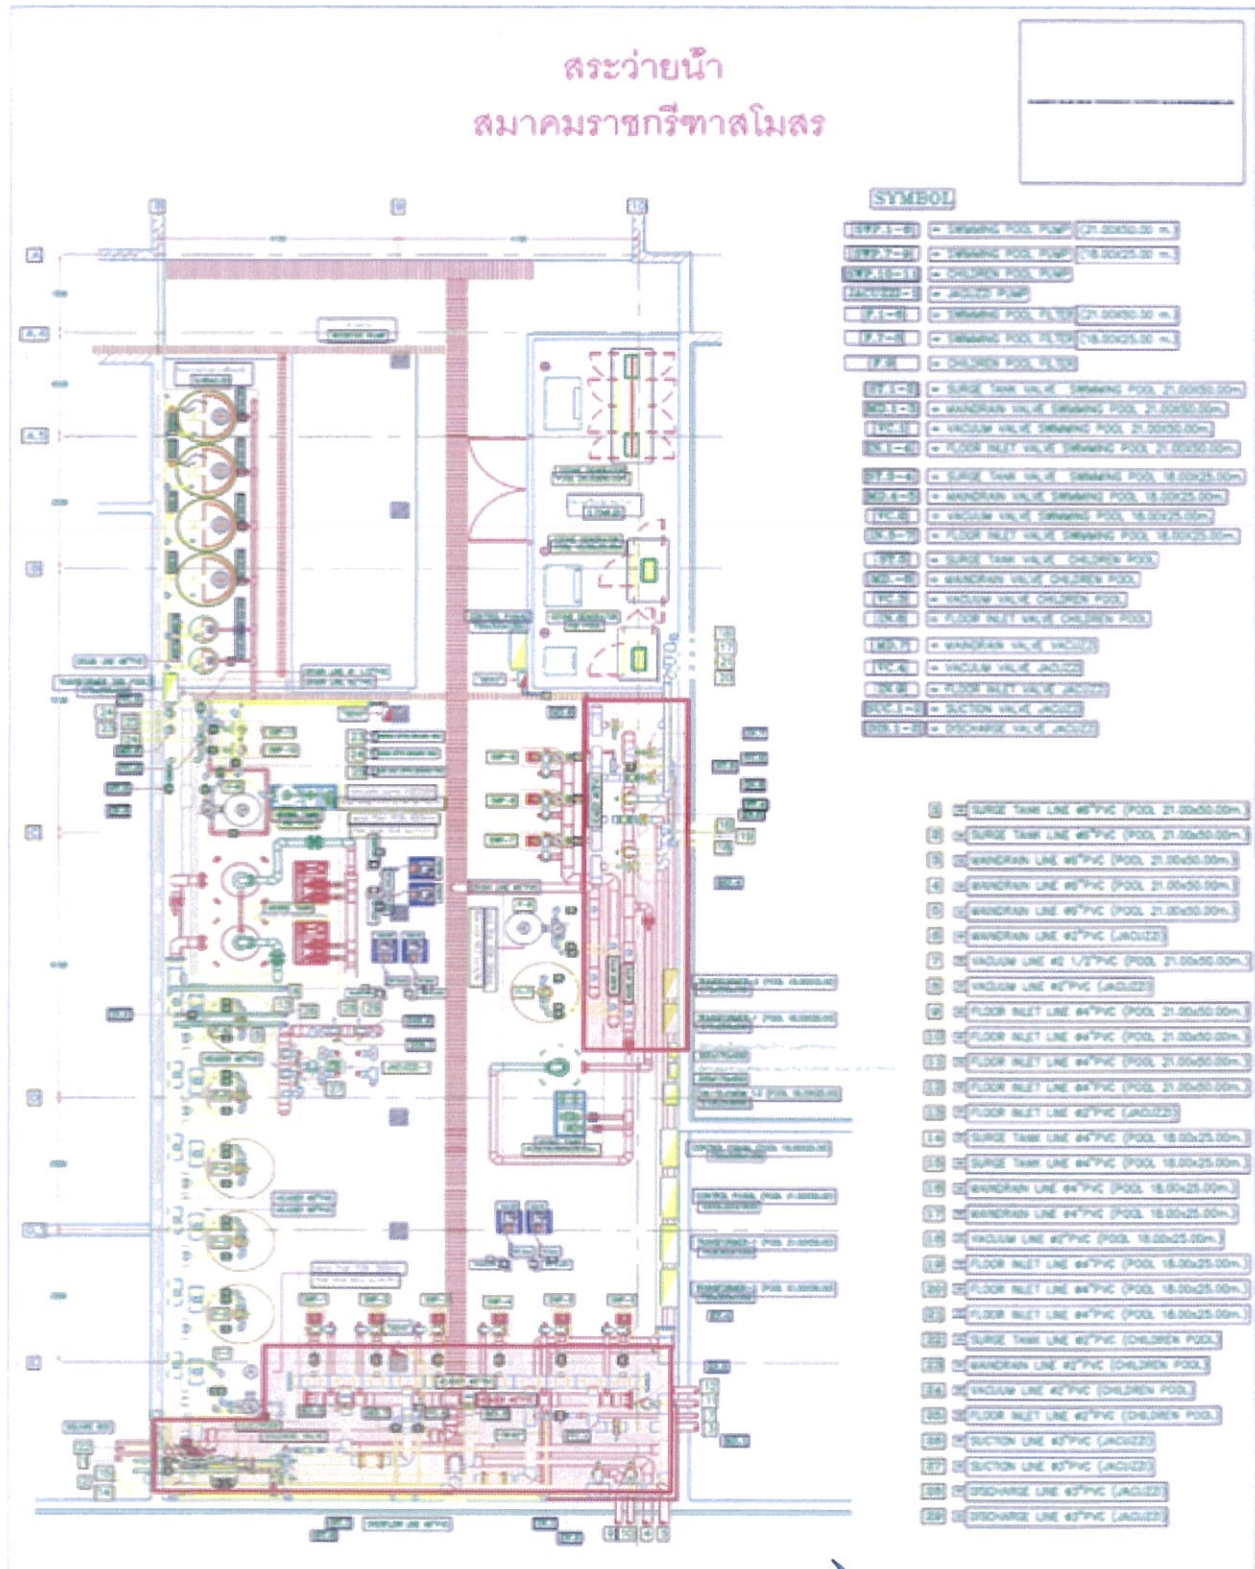

เรื่อง : งานเปลี่ยนท่อทางดูดทางส่งระบบปั๊มสระว่ายน้ำ 25 เมตรและ 50 เมตร สมาคมราชกรีฑาสโมสร

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 23 มกราคม 2569

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

ท่อสระว่ายน้ำ 50 เมตร



ท่อสระว่ายน้ำ 25 เมตร

